

SEQUENCE COMMISSIONING AND START-UP CANDELARIA MILL OPTIMIZATION PROJECT

NO ENERGY / NO CHARGE

WITH ENERGY / NO CHARGE

WITH ENERGY / WITH CHARGE

CONSTRUCTION COMPLETION


PRECOMMISSIONING

COMMISSIONING

FACILITY SYSTEMS

SYSTEMS OF AUXILIARY SERVICES (Operation - Maintenance - Control and Process)

PROCESS SYSTEMS (Unit Operations)

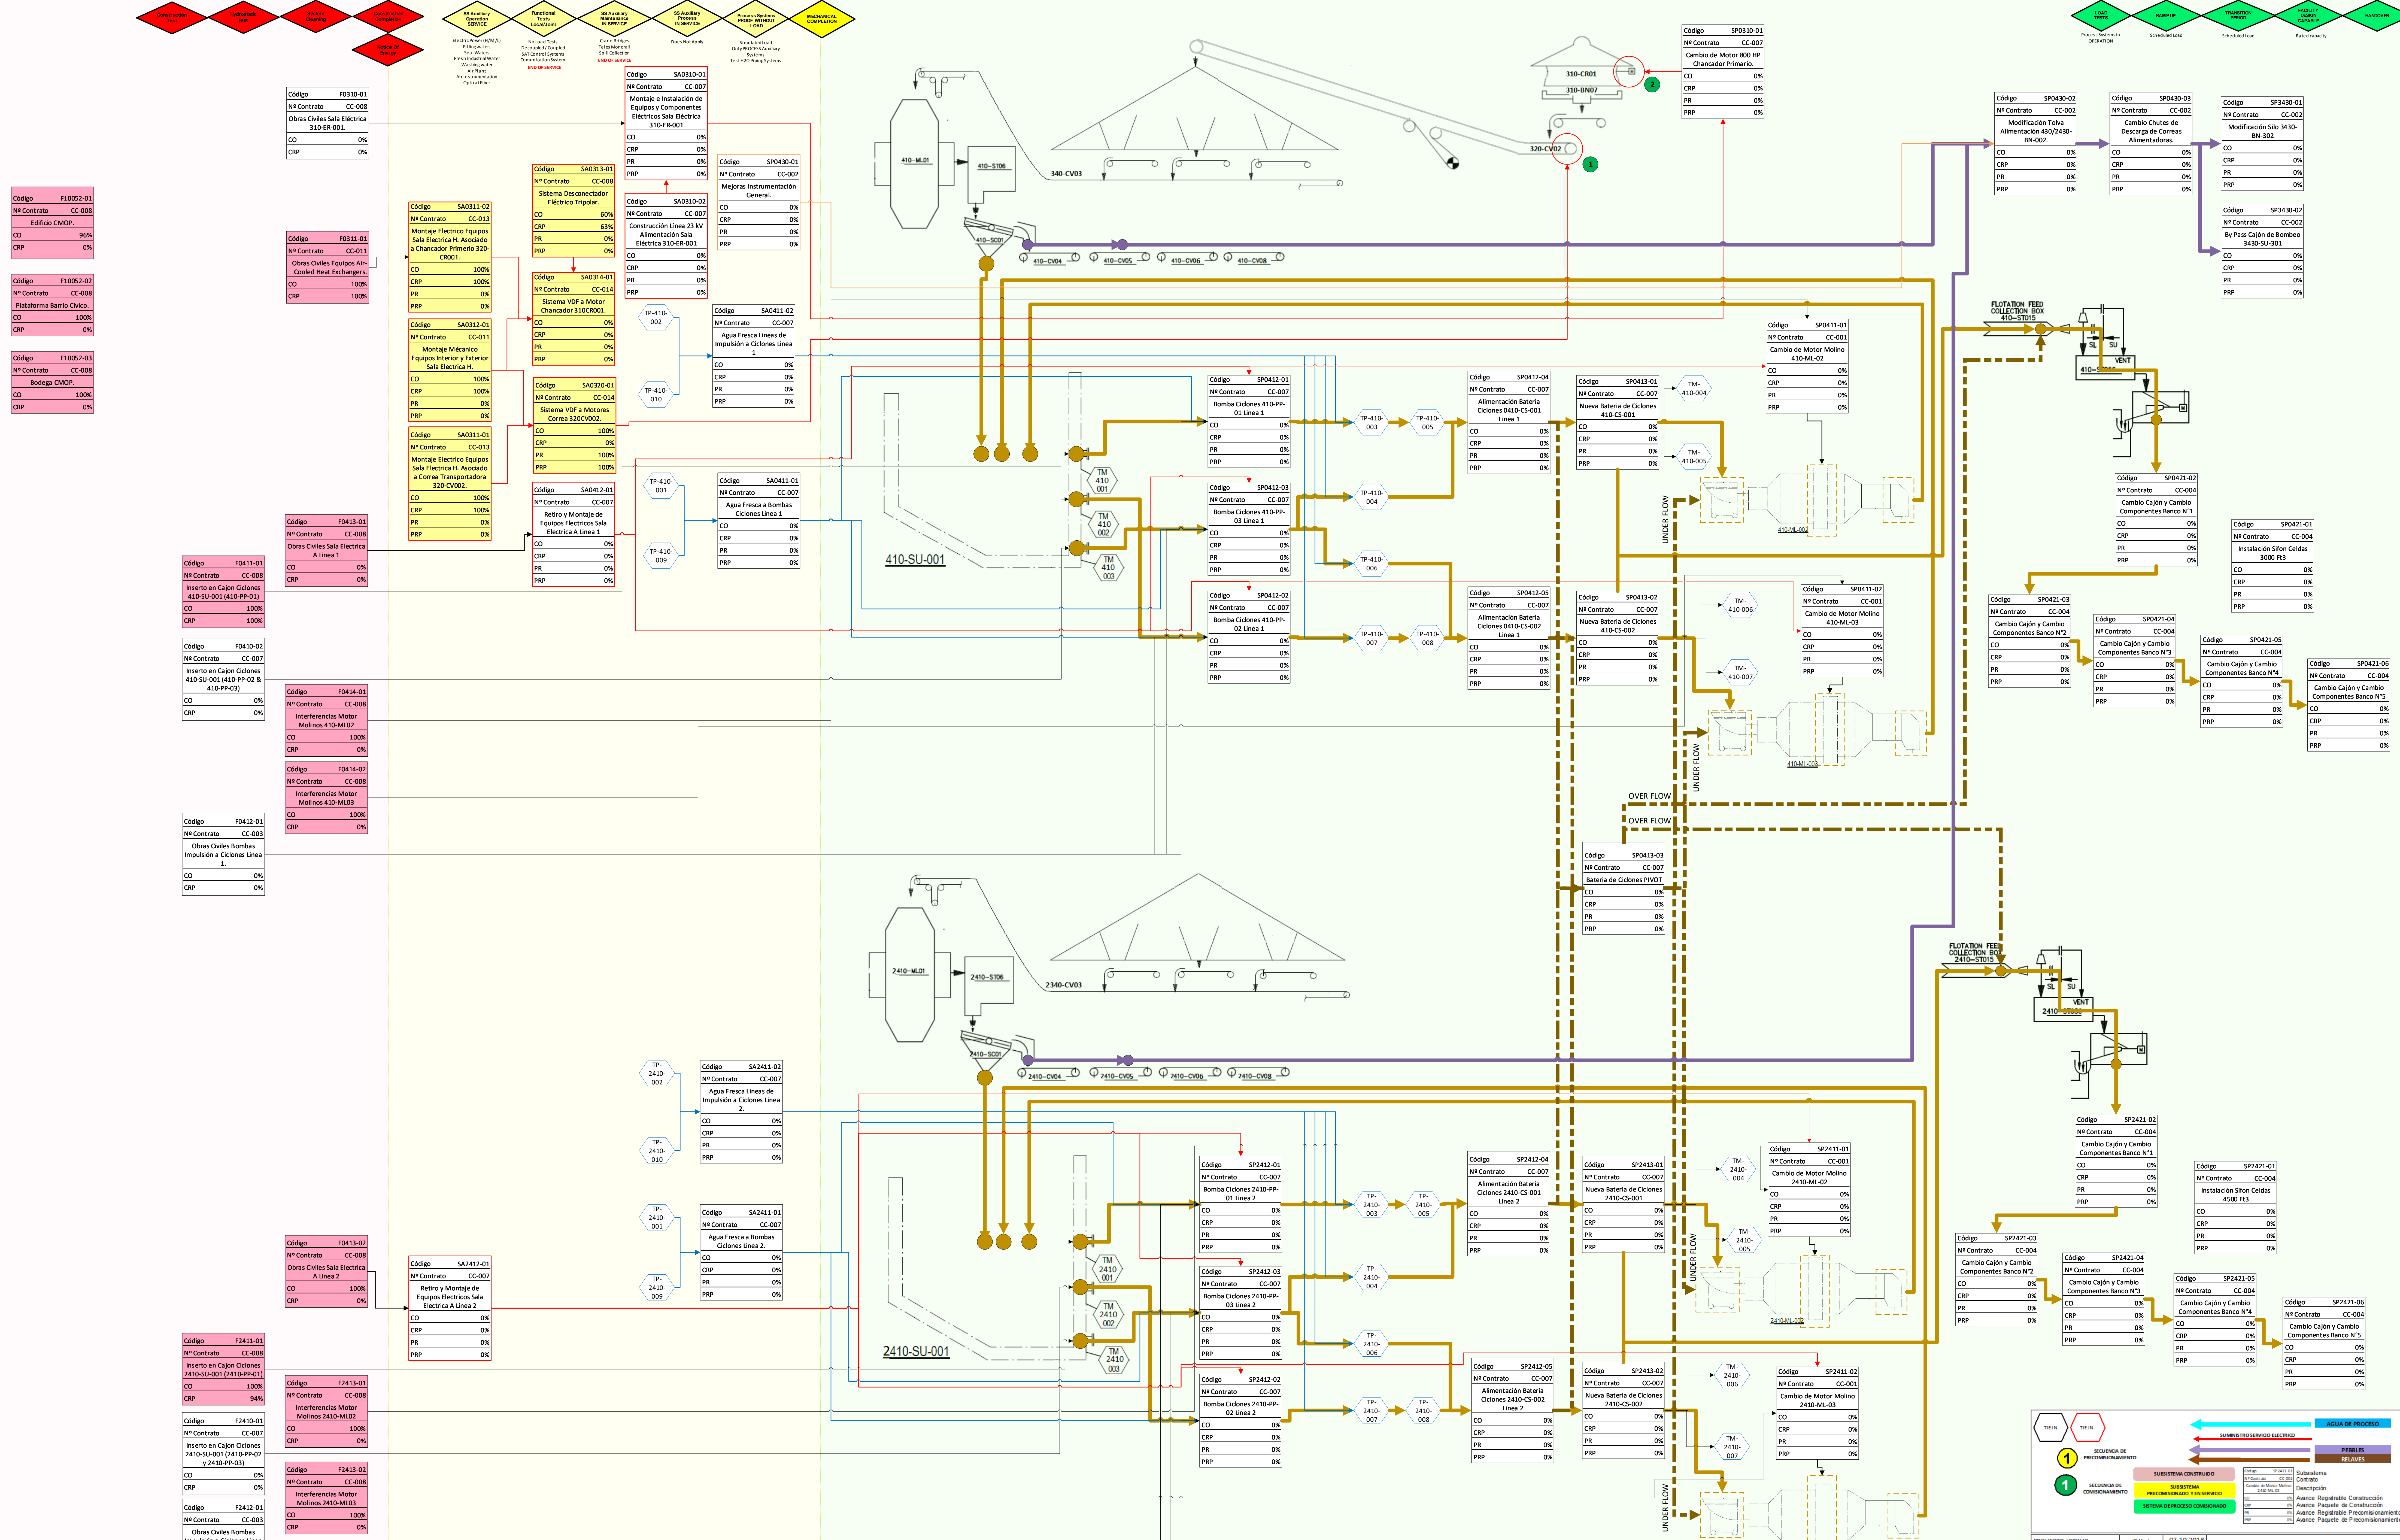

Código	F10052-01
Nº Contrato	CC-008
Edificio CMOP.	96%
CO	0%
CRP	0%

Código	F10052-02
Nº Contrato	CC-008
Plataforma Barrio Civico.	100%
CO	100%
CRP	0%

Código	F10052-03
Nº Contrato	CC-008
Bodega CMOP.	100%
CO	100%
CRP	0%

Código	F0411-01
Nº Contrato	CC-008
Inserto en Cajón Ciclones 410-SU-001 (410-PP-01)	100%
CO	100%
CRP	100%

Código	F0410-02
Nº Contrato	CC-007
Inserto en Cajón Ciclones 410-SU-001 (410-PP-02 & 410-PP-03)	0%
CO	0%
CRP	0%

Código	F0414-01
Nº Contrato	CC-008
Interferencias Motor Molinos 410-ML02	100%
CO	100%
CRP	0%

Código	F0414-02
Nº Contrato	CC-008
Interferencias Motor Molinos 410-ML03	100%
CO	100%
CRP	0%

Código	F0412-01
Nº Contrato	CC-003
Obras Civiles Bombas Impulsión a Ciclones Línea 1	0%
CO	0%
CRP	0%

Código	F2411-01
Nº Contrato	CC-008
Inserto en Cajón Ciclones 2410-SU-001 (2410-PP-01)	100%
CO	100%
CRP	94%

Código	F2410-01
Nº Contrato	CC-007
Inserto en Cajón Ciclones 2410-SU-001 (2410-PP-02 & 2410-PP-03)	0%
CO	0%
CRP	0%

Código	F2413-01
Nº Contrato	CC-008
Interferencias Motor Molinos 2410-ML02	100%
CO	100%
CRP	0%


Código	F2412-01
Nº Contrato	CC-008
Interferencias Motor Molinos 2410-ML03	100%
CO	100%
CRP	0%

Código	F2412-02
Nº Contrato	CC-003
Obras Civiles Bombas Impulsión a Ciclones Línea 2	0%
CO	0%
CRP	0%

Código	F2411-02
Nº Contrato	CC-007
Inserto en Cajón Ciclones 2410-SU-001 (2410-PP-04)	0%
CO	0%
CRP	0%

Código	F2412-03
Nº Contrato	CC-008
Interferencias Motor Molinos 2410-ML03	100%
CO	100%
CRP	0%

Código	F2412-04
Nº Contrato	CC-003
Obras Civiles Bombas Impulsión a Ciclones Línea 2	0%
CO	0%
CRP	0%

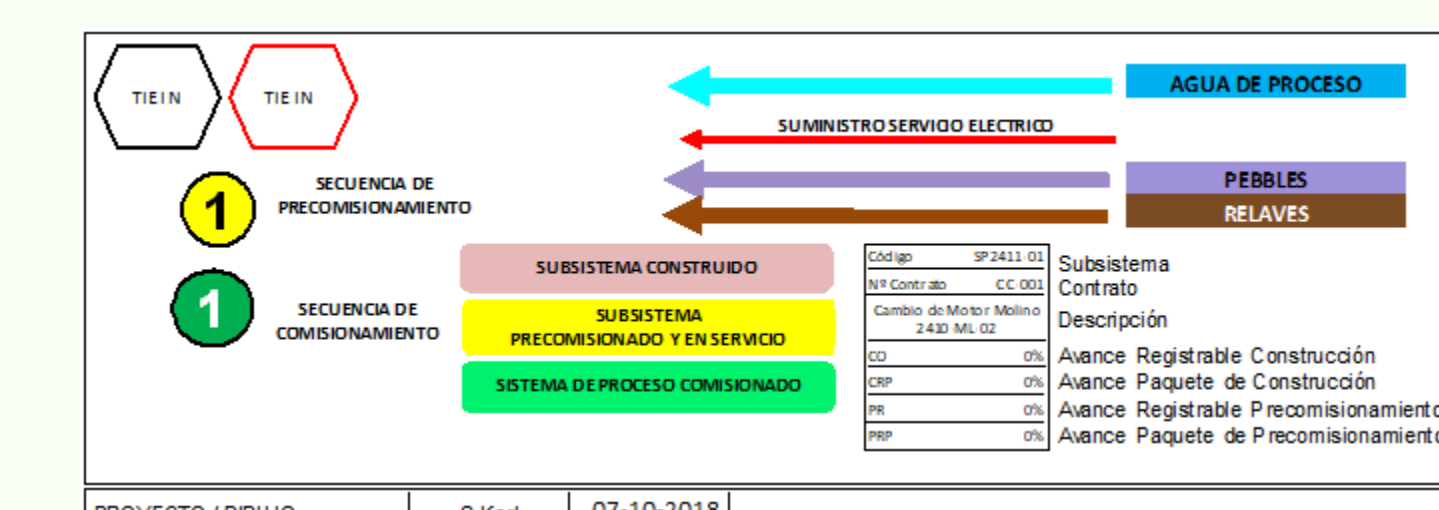

PROYECTO / DIBUJO	S. Kari	07-10-2018
SUP. COMISIONAMIENTO	S. Kari	07-10-2018
GERENTE INGENIERIA	R. Saez	07-10-2018
GERENTE COM. PROY.	J. Español	07-10-2018
GERENTE PROYECTO	M. Hernandez	07-10-2018
GERENTE COM. CLIENTE	L. Carvajal	07-10-2018
GERENTE PROY. CLIENTE		
